

作成 :  
管理番号:

令和 3年度 (仮称)並木駐車場整備工事

# 数量算出根拠計算書

・本工事

測定実施日:


承認	技術担当者

有限会社 東栄ホーム



# 数量計算書

工 事 名	(仮称) 駐車場整備工事		
工 種	土工 集水枳		
規格名称	□600 H=800	単位当り	1基/当り

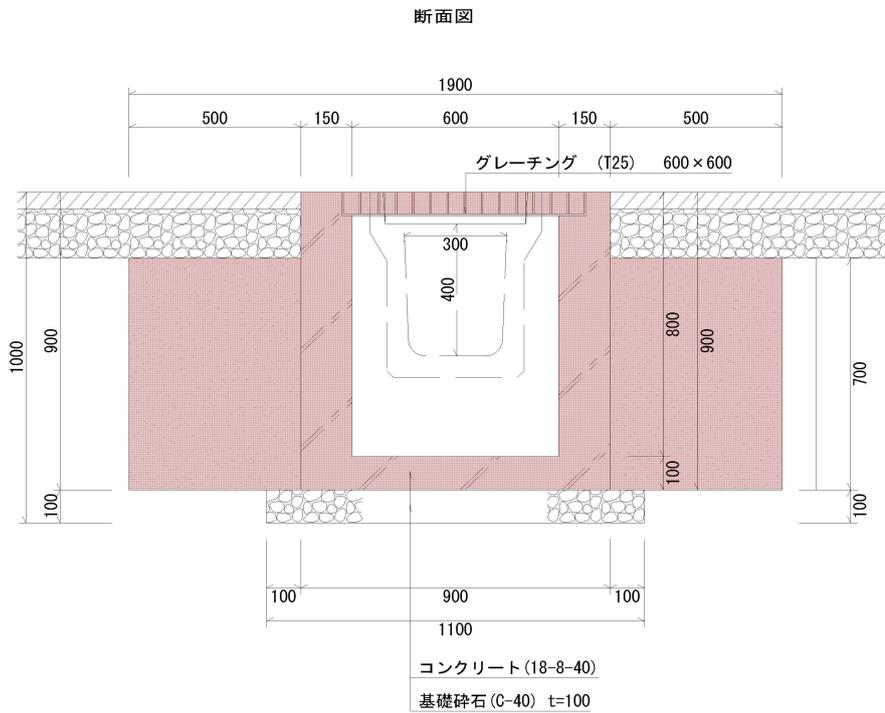

名称	材料	計 算 式	数 量	単 位	備 考	
掘	削	$(1.10 \times 1.10 \times 0.10) + (1.90 \times 1.90 \times 0.90) =$	3.370	3.370	m3	
基礎砕石	C-40	$1.10 \times 1.10 =$	1.210	1.210	m2	
型	枠	普通	$(0.90 \times 0.90 \times 4) + (0.60 \times 0.80 \times 4) =$	5.160	5.160	m2
コンクリート	18-8-40	$(0.90 \times 0.90 \times 0.90) - (0.60 \times 0.60 \times 0.80) =$	0.441	0.440	m3	
埋	戻	$(1.90 \times 1.90 \times 0.70) - (0.90 \times 0.90 \times 0.70) =$	1.960	1.960	m3	
残	土	場内処理	$3.70 - (1.96 / 0.90) =$	1.522	1.520	m3
グレーチング	□600 T-25	$1.0 =$	1.000	1.000	基	





