㈱ミルテック　（仮称）駐車場整備工事

計画、変更、実施　工　程　表

工期　着工　2021年 7月11日
　　完成　2021年 8月30日

請負業者：㈲東栄ホーム

工種	数量	単位	出来高 %	摘要
準備工	1	式	100	
舗装版撤去工（U型側溝部）	100	m²	90	
U型側溝設置工 B300-H400	37.65	m		
歩車道ブロック設置工 h=250	15.60	m	80	
U型側溝設置工 Ⅲ-A-a-30	20	m		
集水桝工 □600　H=600 グレーチングT25	1	基	70	
舗装版撤去工 事務所（前）	160.46	m²		
舗装版撤去工 事務所（横）	29.1	m²	60	
路盤掘削 工場（北）	104.4	m²		
路盤掘削 看板（周囲）	46.51	m²	50	
土間コンクリート 看板（周囲）事務所（横）	75.61	m²		
アスファルト舗装工 事務所（前）工場（北）	372.83	m²	40	
跡片付け	1	式	30	
			20	
			10	
			0	

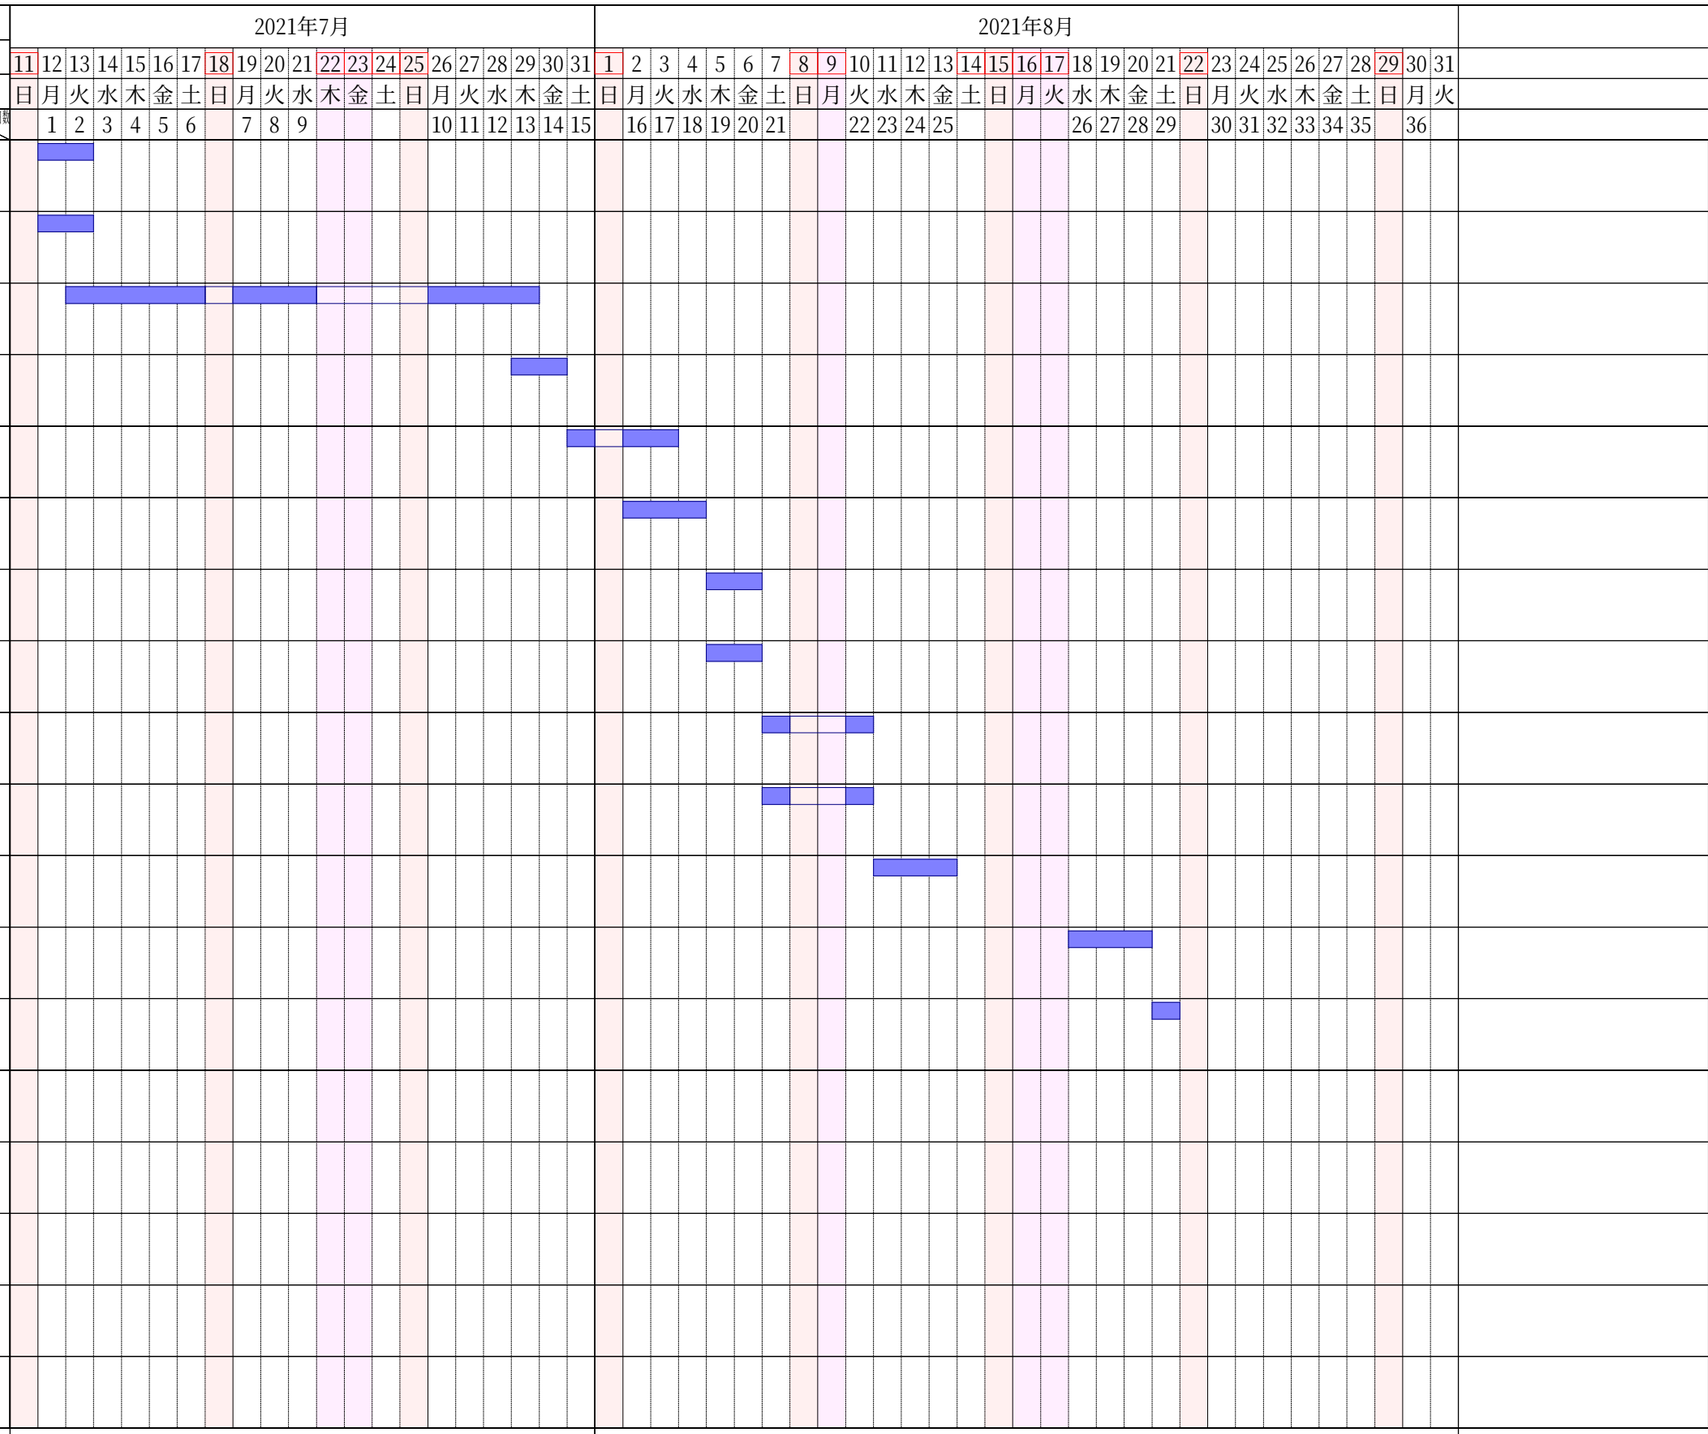

施工進度管理
- 予定
- 変更予定
- 実施

全体（　金額　）工程
予定
実施

記事
（指示・検討・是正事項）
